

PEMBUATAN DAN PEMASANGAN PAGAR BRC SITUS CANDI NEGERI BARU



CV. WIRATAMA

2019

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa karena atas berkat rahmat dan hidayah-Nya, penyusunan laporan kegiatan pelaksanaan pembuatan dan pemasangan pagar BRC Situs Candi Negeri Baru di Kecamatan Benua Kayong, Kabupaten Ketapang, Provinsi Kalimantan Barat dapat diselesaikan sesuai rencana yang telah ditetapkan.

Kegiatan ini merupakan program kerja Balai Pelestarian Cagar Budaya Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2019, yang berlangsung selama 30 (tiga puluh) hari dimulai dari tanggal 11 Maret s.d 9 April 2019. Dalam pelaksanaan kegiatan hingga tersusunnya laporan ini, tidak lepas dari bantuan dan kerjasama berbagai pihak. Oleh karena itu kami sampaikan terima kasih kepada :

1. Kepala Balai Pelestarian Cagar Budaya Kalimantan Timur, yang telah memberikan arahan dan bimbingan hingga tersusunnya laporan ini;

KATA PENGANTAR

3. Kepala Seksi Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfaatan Balai Pelestarian Cagar Budaya Kalimantan Timur atas masukannya dalam proses penentuan lokasi penempatan prasarana pelindungan di lingkungan situs;
4. Anggota tim pelaksana kegiatan pembuatan dan pemasangan pagar BRC Situs Candi Negeri Baru atas kerja samanya dari awal kegiatan hingga tersusunnya laporan;
5. Masyarakat sekitar atas kerjasama dan bantuannya pada saat proses pembangunan dilaksanakan.

Seluruh pihak yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu yang telah membantu kegiatan ini. Penyusunan laporan ini tidak lepas dari kekurangan dan ketidaksempurnaan.

KATA PENGANTAR

Oleh karena itu, kami mengharapkan masukan dan saran dari semua pihak untuk melengkapi dan menyempurnakan laporan ini.

Samarinda, April 2019

CV. Wiratama

A. Dasar Hukum


1. Surat Penunjukan Penyedia untuk Pelaksanaan Paket Pembuatan dan Pemasangan Pagar BRC Situs Candi Negeri Baru Nomor 0558/E24/LK/2019 tanggal 11 Maret 2019;
2. Surat Perintah Kerja Nomor 0559/E24/LK/2019 tanggal 11 Maret 2019;
3. Surat Perintah Mulai Kerja Nomor 0560/E24/LK/2019 tanggal 11 Maret 2019.

B. Jangka Waktu Pelaksanaan

Pekerjaan pembuatan dan pemasangan pagar BRC Situs Candi Negeri Baru dilaksanakan selama 30 (tiga puluh) hari kalender dan pekerjaan harus sudah selesai pada tanggal 9 April 2019, dengan tanggal mulai kerja 11 Maret 2019.

A. SPESIFIKASI TEKNIS

PEMBUATAN ATAP PELINDUNG SITUS CANDI NEGERI BARU

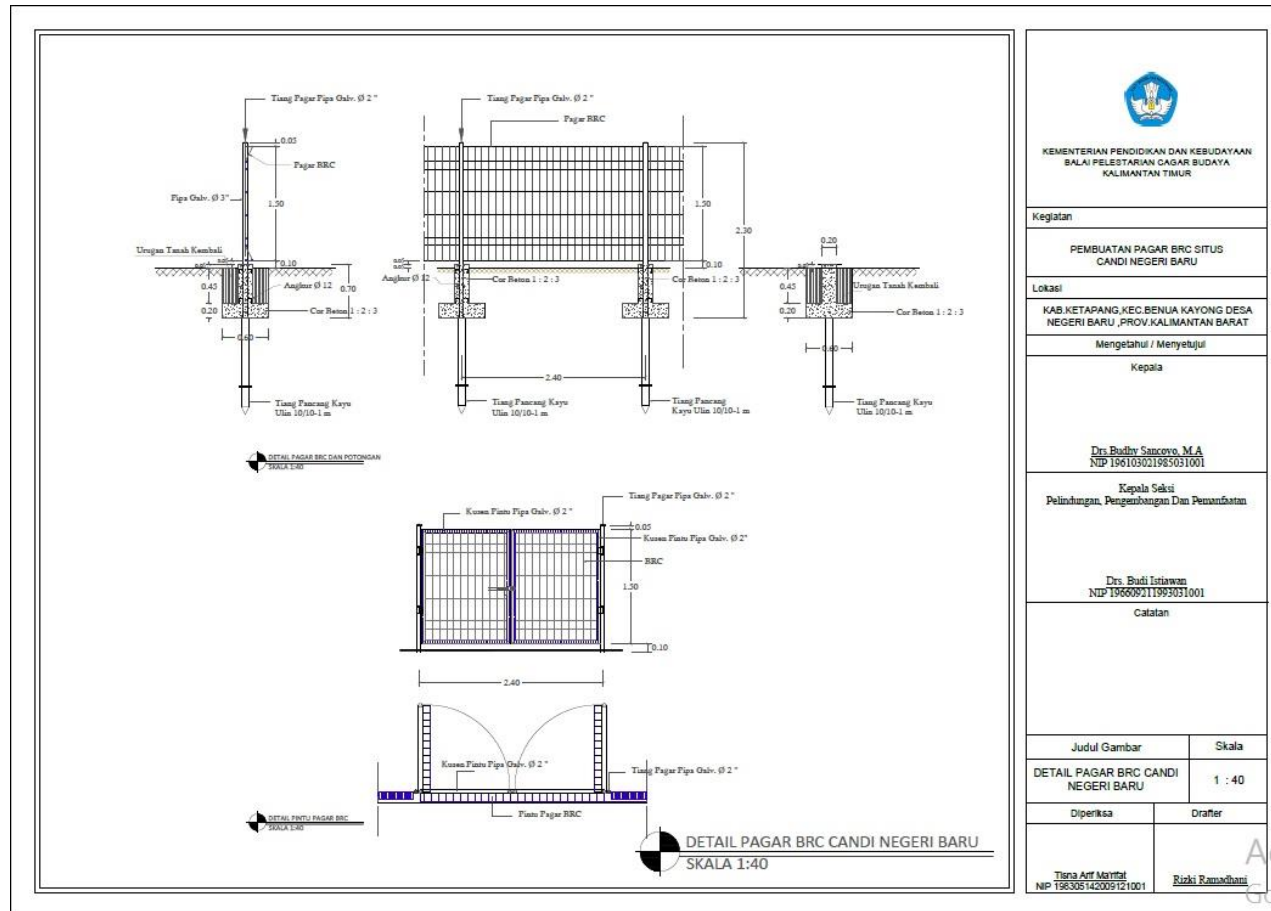

Spesifikasi :

- Pondasi poorplat
- Tiang pagar pipa galvanis dia. 2"
- Cerucuk kayu ulin
- Pagar BRC



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
SALAH PELESTARIAN CAGAR BUDAYA
KALIMANTAN TIMUR

Kegiatan

PEMBUATAN PAGAR BRC SITUS
CANDI NEGERI BARU

Lokasi

KAB.KETAPANG,KEC.BENUA KAYONG DESA
NEGERI BARU,PROV.KALIMANTAN BARAT

Mengetahui / Menyetujui

Kepala

Drs. Budi Suroyo, M.A.
NIP.196103021987031001

Kepala Seksi
Pelindungan, Pengembangan Dan Pemantapan

Drs. Budi Istiawan
NIP.196609211993031001

Catatan

Judul Gambar

Skala

DETAIL PAGAR BRC CANDI
NEGERI BARU

1 : 40

Diperiksa

Drafter

Tiana Ann Marifat
NIP.198305142005121001

Rizki Ramadhani

B. METODELOGI PELAKSANAAN

- a. Membuat galian tanah dengan ukuran 100 cm x 100 cm, dengan kedalaman 65 cm;
- b. Cerucuk kayu ulin dan jangkar tiang pagar ditanam sedalam 100 cm;
- c. Pemasangan pondasi batu belah dan poorplat dengan ukuran penampang atas 20 cm, penampang bawah 60 cm, dan kedalaman 65 cm;
- d. Pemasangan pagar BRC dengan ukuran tinggi 150 cm dan 240 cm jarak pergawangnya. Pagar BRC di koneksikan dengan tiang pagar dan pondasi.
- e. Pemasangan pagar BRC dan tiang pagar galvanis menggunakan sistem baut dengan perkuatan di las pada setiap sambungan dan kuncian baut.

Waktu penyelesaian pekerjaan sesuai dengan perjanjian isi kontrak selama 30 hari kerja.
Jadwal waktu pelaksanaan terlampir.

BAB II**VOLUME PEKERJAAN**

No	Uraian Pekerjaan	Volume
	A. PEKERJAAN PERSIAPAN	
1.	Pembersihan Lokasi	1,00 Ls
2.	Pemasangan Bowplank	120,00 m'
	B. PEKERJAAN TANAH	
1.	Galian tanah pondasi	12,64 m ³
2.	Urugan tanah kembali	7,78 m ³
	C. PEKERJAAN KAYU	
1.	Pas. Cerucuk Ulin 10/10 p=1m	0,54 m ³
	D. PEKERJAAN BETON BERTULANG 1pc:2ps:3kr	
1.	Cor Pondasi Poor Plat	3,89 m ³
2.	Cor Kolom 20/20	1,08 m ³
3.	Cor Biasa Dalam Tiang Galvanis 2inch	0,24 m ³

BAB II**VOLUME PEKERJAAN**

No	Uraian Pekerjaan	Volume
	E. PEKERJAAN BESI BRC	
1.	Pas. Pagar BRC (tinggi 1,5m), Tiang dan pintu	120,00 m'



Foto 1. Pagar BRC yang akan dipasang



Foto 2. Pekerjaan Galian Tanah Pondasi



Foto 3. Pagar BRC Pada Sisi Barat Daya



Foto 4. Pagar BRC Pada Sisi Barat Daya



Foto 5. Pagar BRC Pada Sisi Timur



Foto 6. Pagar BRC Pada Sisi Selatan



Foto 7. Pagar BRC Tampak Depan (Sisi Timur)

A. KESIMPULAN

1. Kegiatan pembuatan dan pemasangan pagar BRC Situs Candi Negeri Baru yang bertempat di Desa Negeri Baru, Kecamatan Benua Kayong, Kabupaten Ketapang telah selesai dikerjakan selama 30 hari kerja sesuai dengan perjanjian yang tertera di kontrak, spesifikasi dan hasil pekerjaan sesuai dengan gambar kerja yang telah disetujui bersama.

Demikian laporan kegiatan pembuatan dan pemasangan pagar BRC Situs Candi Negeri Baru di Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat. Semoga bermanfaat bagi kita semua.

Samarinda, April 2019

CV. Wiratama

Penulis

LAMPIRAN

- a. Gambar Kerja**
- b. RAB**
- c. Time Schedule**
- d. Surat Perintah Kerja**
- e. Surat Perintah Mulai Kerja**
